

Riolerings- en wegenwerken Rotselaar-Centrum

De gemeente Rotselaar voert momenteel riolerings- en wegenwerken uit in de Kapelstraat, Pastorijsstraat, Groenstraat en Parkstraat. Een vernieuwingsproject waarmee de gemeente gescheiden riolering voorziet en de weg veiliger en comfortabeler inricht voor een mooie en leefbare buurt.

Save the date: buurtfeest

Het vernieuwingsproject is ondertussen bijna klaar. We nodigen je dan ook graag al uit voor een buurtfeest om het einde van de werken te vieren. Je bent welkom op **zaterdag 29 juni om 14.00 uur** op de speelplaats van GBS 'de Straal'. We voorzien een drankje en een hapje om dit mooie project feestelijk te openen. De officiële uitnodiging volgt nog.

Stand van zaken

Kapelstraat (tussen Provinciebaan en Pastorijsstraat)

- De toplaag asfalt is gelegd en de opritten zijn aangewerkt.
- Wegmarkeringen en plaatsing van verkeersborden is volgens de huidige planning voorzien op maandag 24 en dinsdag 25 juni. De groenaanplant volgt in het plantseizoen dit najaar.

Pastorijsstraat en Groenstraat (tot en met huisnummer 27)

- De rioleringswerken zijn uitgevoerd en de klinkers aangelegd.
- Wegmarkeringen en plaatsing van verkeersborden is volgens de huidige planning voorzien op maandag 24 en dinsdag 25 juni. De groenaanplant volgt in het plantseizoen dit najaar.

Kapelstraat (tussen Pastorijsstraat en Torenstraat) en Sint-Antoniusstraat


- De toplaag asfalt is aangelegd, de klinkerwerken aan de voetpaden zijn afgerond en de opritten zijn aangewerkt.
- Bij goed weer en zonder technische problemen, finaliseert de aannemer op 18 en 19 juni het kruispunt van de Kapelstraat met de Pastorijsstraat. Op 20 en 21 juni gebeurt dat voor het kruispunt van de Kapelstraat met de Groenstraat. Tijdens de afwerking is het kruispunt afgesloten. Beide kruispunten worden niet gelijktijdig afgesloten, waardoor je altijd gebruik kunt maken van het andere kruispunt.
- Wegmarkeringen en plaatsing van verkeersborden is volgens de huidige planning voorzien op maandag 24 en dinsdag 25 juni. De groenaanplant volgt in het plantseizoen dit najaar.

Groenstraat (van Kapelstraat tot huisnummer 30) en Parkstraat

- De rioleringswerken in de Groenstraat en Parkstraat zijn uitgevoerd.
- De klinkers in de Groenstraat zijn aangelegd.
- De klinkers in de Parkstraat worden momenteel aangelegd. De aannemer plant hier, bij goed weer en zonder technische problemen, klaar te zijn op 21 juni.
- Wegmarkeringen en plaatsing van verkeersborden is volgens de huidige planning voorzien op maandag 24 en dinsdag 25 juni. De groenaanplant volgt in het plantseizoen dit najaar.
- Bij de wegmarkeringen hoort ook een regenboogzebrapad ter hoogte van de school. Het regenboogzebrapad komt niet toevallig in de kleurrijke zone met onder andere GBS 'de Straal', het Huis van het Kind en de buitenschoolse kinderopvang. Het staat voor diversiteit, inclusie, respect en verdraagzaamheid en past dus perfect in de buurt.
- Fietsers kunnen in deze fase geen nog gebruik maken van het Menapad. De omleiding loopt via de Provinciebaan.

Meer info

Voor updates over het vernieuwingsproject in Rotselaar-Centrum kun je terecht op de gemeentelijke website: www.rotselaar.be/werken-centrum. Een overzicht van alle vernieuwingsprojecten vind je via: www.rotselaar.be/wegenwerken.

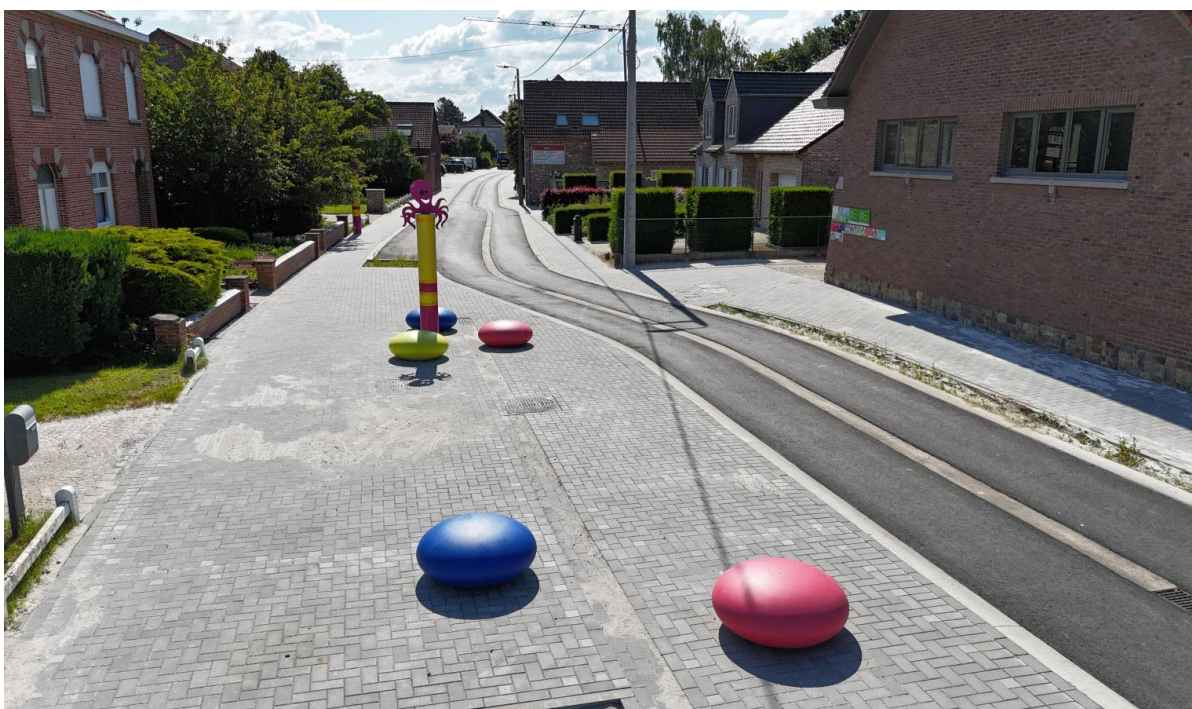

Rotselaar vernieuwt
