



TM Superbeton - Hoogmartens
Betekomsesteenweg 124
3200 Aarschot

Tel. : 014 / 53.88.88
Fax : 014 / 54.48.00
BTW : BE 0408.164.617
e-mail : info@superbeton.be

MEDEDELING AAN DE BEWONERS
Vakenstraat / Steenweg Gelrode
Update planning werken Steenweg op Gelrode

30/05/2022

Betref: Aansluiting Zallaken op Terheidelaan – Rotselaar
22.289

Beste bewoner,

Hierbij geven wij jullie een update over het verloop van de werken op de Steenweg op Gelrode.

Huidige fase:

De rioleringswerkzaamheden op de Steenweg op Gelrode tussen de Kerkweg en de Schoolstraat zijn klaar tegen 9 juni 2022. Alle huizen zijn dan aangekoppeld op de riolering en er zal een tijdelijke werfweg liggen.

Deze zone is bereikbaar voor plaatselijk verkeer, rekening houdend met het werfverkeer en de werkzaamheden die lokaal nog hinder kunnen veroorzaken.

De aansluiting van de Kerkhofstraat en de Kerkweg op de Steenweg op Gelrode zal telkens afwisselend 1 week onderbroken worden voor het plaatsen van een overstortconstructie. Wij houden u nog op de hoogte van de juiste plaatsingsdatum.

Volgende fase:

De volgende fase die Superbeton zal uitvoeren gaat over het stuk tussen de Schoolstraat en de Beukenlaan. Tijdens deze fase zal de aansluiting van de Beukenlaan op de Steenweg op Gelrode openblijven voor het plaatselijk verkeer. De Schoolstraat wordt wel afgesloten ter hoogte van de Steenweg op Gelrode.

Deze fase gaat van start op vrijdag 10 juni 2022 met het opbreken van de betonverharding.

Het plaatsen van de rioolbuizen start op maandag 13 juni 2022, eerst de vuilwaterafvoer en vervolgens de regenwaterafvoer. Deze werken gaan vermoedelijk +/- 3 weken duren. Hierbij gaat u tijdelijk wat meer hinder ondervinden. Wij doen ons uiterste best om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden.


Asfaltverharding:

Vóór het zomerbouwverlof wordt de gecementeerde fundering geplaatst tussen de Kerkhofstraat en de Beukenlaan (deze fundering is overrijdbaar), zodat wij in augustus de ter plaatste getrokken boordsteen kunnen plaatsen.

Na de uitharding van de beton wordt de asfaltverharding geplaatst (8-12 augustus 2022).

De aannemer van de nutsleidingen start in de week van 15 augustus 2022 met de plaatsing van de nutsleidingen. Deze werken zullen vermoedelijk 2 maand in beslag nemen.

In deze periode werken wij de bovenbouw af in de Vakenstraat tussen de Terheidelaan en de Kerkhofstraat.

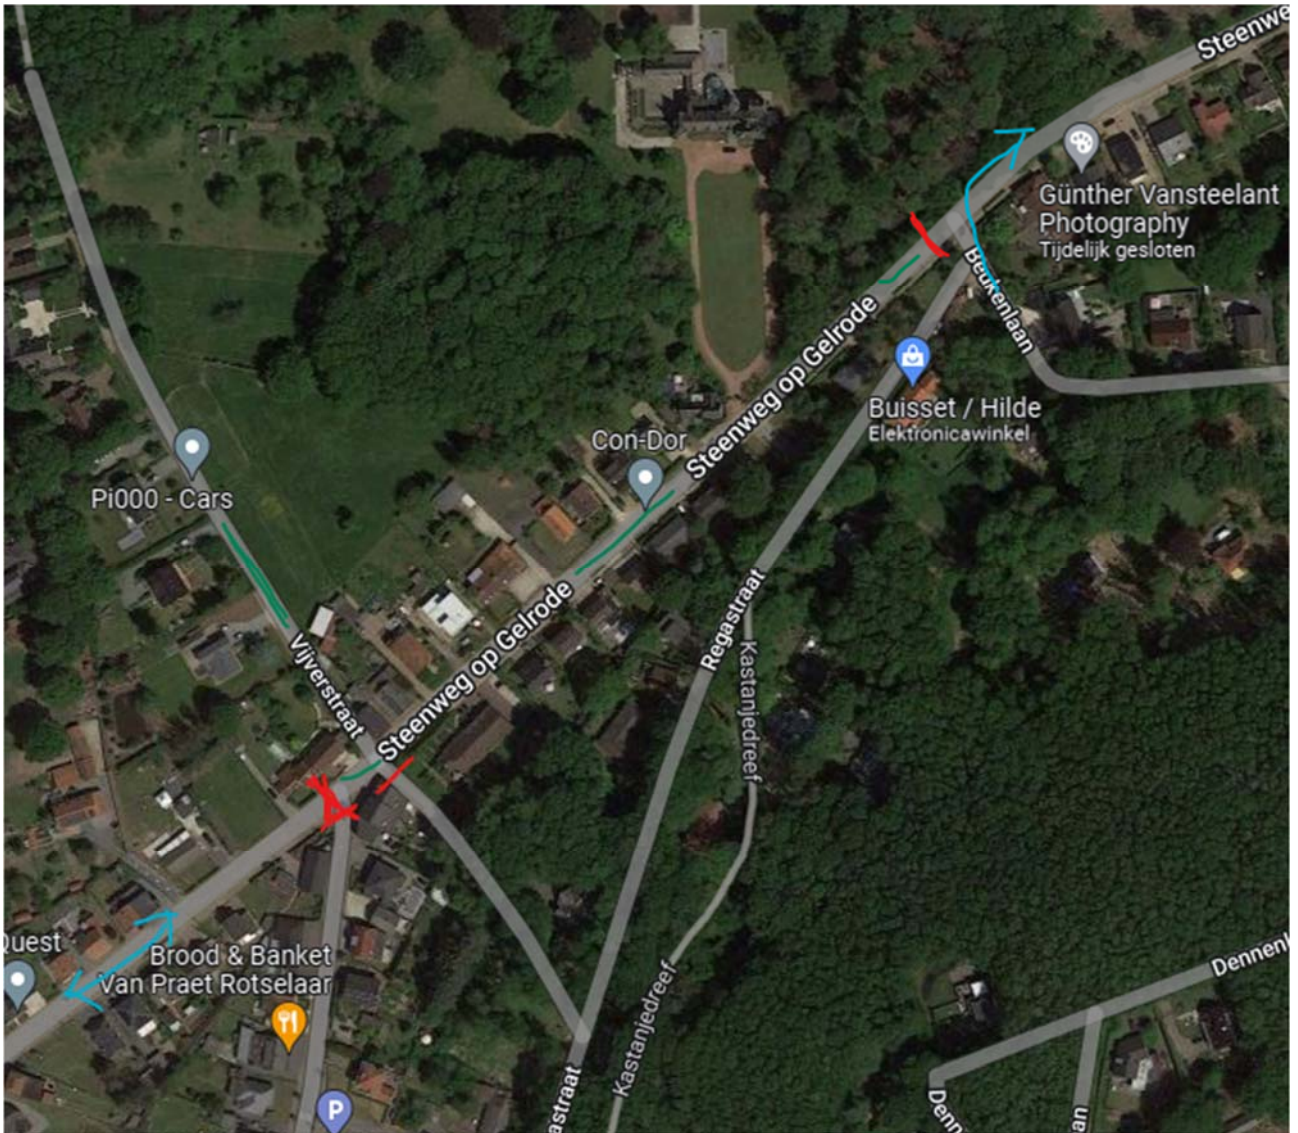

Onze werfleider is **Johan Princen**. Johan is elke werkdag op de werf aanwezig om de ploegen aan te sturen en jullie te woord staan voor al jullie vragen en bekommernissen. Hij is te bereiken op volgend gsm nr; **+32 495 295 203**.

Superbeton zal jullie via deze weg regelmatig op de hoogte houden over het verloop van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,
Dumortier Jeroen
Projectleider
Superbeton bv
